



**RELATÓRIO MENSAL DO
PROGRAMA DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL - PGA**

UHE BAIXO IGUAÇU

DEZEMBRO 2017

CEBI 361-2018





IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR

Consórcio Empreendedor Baixo Iguaçu - CEBI

CNPJ: 19.469.993/0001-73

Rua Tupinambás, 1.187 – Centro – Capanema – PR – 85760-000.

Telefones para contato:

Escritório Central - Capanema (46) 3552-8500

Escritório Capitão Leônidas Marques (45) 3286-3058

Contato:

Gerente de Meio Ambiente

Telefone: (46) 3552-8500 E-mail: guilherme.siqueira@baixoiguacu.com.br

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	4
2. METODOLOGIA	5
3. RESULTADOS DO PERÍODO	5
4. ATIVIDADES A REALIZAR NO PRÓXIMO PERÍODO	10

1. INTRODUÇÃO

O Consórcio Empreendedor Baixo Iguaçu (CEBI) é constituído pelas empresas Geração Céu Azul S.A., subsidiária da Neoenergia S.A, e Copel Geração e Transmissão S.A, subsidiária da Copel S.A, e tem por objetivo implantar e comercializar a energia gerada na Usina Hidrelétrica Baixo Iguaçu (UHEBI).

O barramento da UHEBI localiza-se nas coordenadas 25°30's e 53°40'w, a 174 km da foz do rio Iguaçu, imediatamente a montante da confluência com o rio Gonçalves Dias, entre os municípios de Capanema (margem esquerda) e Capitão Leônidas Marques (margem direita), no estado do Paraná. O empreendimento tem potência instalada de 350,2 MW, com reservatório a ser formado na cota 259,00m e área alagada de 13,59km² em seu Nível de Água (NA) Máximo Normal.

No bojo do processo de licenciamento ambiental do empreendimento são contemplados 33 programas e subprogramas ambientais do PBA, 66 condicionantes da Licença de Instalação nº 17.033/2015 do Instituto Ambiental do Paraná (IAP) e 27 condicionantes da Autorização para o Licenciamento Ambiental nº 01/2015 do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). O CEBI obteve a Renovação da Licença de Instalação (RLI) nº 17033/2015, a qual foi emitida em 25 de agosto de 2015 pelo Instituto Ambiental do Paraná (IAP), com validade até 25 de agosto de 2017. Em 25 de abril de 2017 foi solicitado a renovação da mesma, estando o empreendedor no aguardo do deferimento.

Entre os programas ambientais do PBA destaca-se o Programa de Gerenciamento Ambiental (PGA) que define o processo gerencial a ser adotado para a execução de um conjunto de ações destinadas, basicamente, a evitar, controlar, mitigar ou compensar as consequências dos impactos provocados pelas obras de implantação do empreendimento e por suas instalações de apoio, buscando soluções para processos potenciais de degradação ambiental que poder ser por elas deflagrados.

Segundo o PBA, o Programa de Gerenciamento Ambiental possui o objetivo principal de dotar a gerência do empreendimento UHE Baixo Iguaçu de mecanismos eficientes que garantam a execução e o controle das ações planejadas nos vários programas e a adequada condução ambiental das obras, além do controle das informações e manutenção de um elevado padrão de qualidade na implantação e operação do empreendimento.

As ações realizadas no âmbito do PGA são apresentadas em relatórios trimestrais desde a obtenção da referida LI. Em junho de 2017, a equipe técnica do CEBI realizou um *Workshop* interno onde foi apresentado o Plano de Ação (PA) do Programa de Gerenciamento Ambiental. O PA tem como objetivo específico identificar e antecipar situações adversas por meio de ações preventivas e corretivas, impedindo que tais situações se estabeleçam como problemas, bem como proporcionar um controle gerencial de todas as fases do projeto, agilizando decisões a partir de informações estruturadas e disponíveis para consulta, aumentando o controle gerencial e tornando a organização do projeto mais eficiente, uma vez que possibilita o seu acompanhamento e monitoramento desde seu início até o seu

encerramento. Entre as ações do PA, e em conformidade com a Condicionante nº 04 da Licença de Instalação nº 17033/2015 do IAP, consta a apresentação mensal do relatório do Programa de Gerenciamento Ambiental.

Neste contexto, o objetivo deste relatório mensal é de apresentar, de forma consolidada, o status de execução dos programas socioambientais integrantes do Projeto Básico Ambiental (PBA) da UHEBI no período decorrido no mês de dezembro de 2017, bem como o atendimento às condicionantes da RLI Nº 17.033/2015 e da Autorização Ambiental (ALA) Nº 01/2015, emitida pelo Instituto Chico Mendes de Biodiversidade (ICMBio).

2. METODOLOGIA

O status de execução dos programas socioambientais, bem como das condicionantes da LI e ALA é apresentado de forma consolidada por pacote de trabalho. O PA considera como pacote de trabalho o conjunto de escopo interacionados de programas e condicionantes. Sendo assim, um pacote de trabalho poder estar relacionado a um único programa, a uma única condicionante, ou a um programa e suas respectivas condicionantes associadas.

Para o relatório mensal é previsto a apresentação gráfica da evolução da execução dos pacotes de trabalho, bem como a descrição resumida das ações efetivadas durante o período de análise. Cabe ressaltar que o detalhamento das ações, bem como as suas respectivas comprovações são objeto de apresentação dos relatórios específicos de cada Programa Ambiental, bem como nos relatórios trimestrais e anuais.

Adotou-se como premissa a seguinte classificação de evolução do percentual de andamento da execução dos pacotes de trabalho:


- não iniciado - 0%;
- em fase de elaboração de Termo de Referência (TR) para contratação - 3%;
- processo de coleta de preços - 5%;
- propostas técnicas coletadas - 7%;
- executora contratada - 10 %;
- atividades iniciadas pelas executoras – 25%;
- metade das atividades previstas executadas – 50%;
- quase a totalidade das atividades previstas executadas – 75%, e;
- todas as atividades previstas executadas – 100%

3. RESULTADOS DO PERÍODO

Os painéis a seguir apresentam os resultados da evolução, bem como uma síntese de cada um dos pacotes de trabalho.

Programa de Comunicação Social / Condicionante 06 - IAP


% realizado	% a realizar
50%	50%

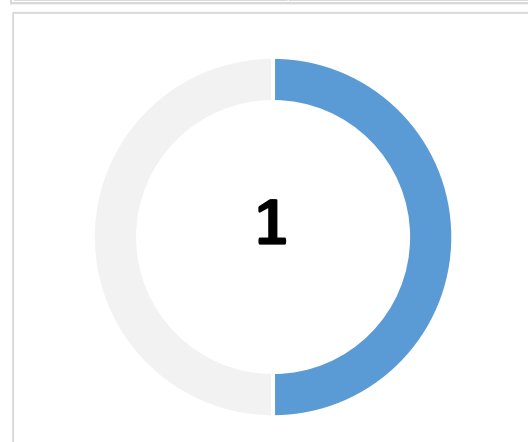

- Realização de visitas na obra, do Programa Portas Abertas (2 instituições e 55 visitantes) e evento de inauguração da Escola Santa Mônica, de Capitão Leônidas Marques (04/12/17);
- Divulgação de jingles em 4 rádios, exibição de vídeo em lotéricas, veiculação de anúncios em jornais e entrevista do diretor presidente do CEBI, para o Jornal de Beltrão, O Paraná e locais;
- Não foram realizadas visitas aos proprietários das áreas do futuro reservatório, visto que a equipe de comunicação estava mobilizada em outras ações e atuando no planejamento do programa de comunicação de 2018.

Programa de Educação Ambiental / Programa de Apoio à Elaboração das Agendas 21


% realizado	% a realizar
50%	50%

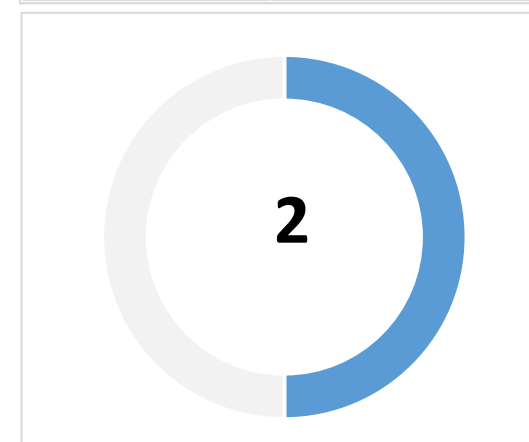

- Realização do planejamento da atividade de Formação em Educação Ambiental para docentes;
- Planejamento das próximas Vivências em Educação Ambiental;
- Planejamento das Oficinas junto às comunidades, de acordo com as temáticas definidas por cada comunidade dos municípios;
- Elaboração de Cartilha para os Trabalhadores da obra.


Programa de Controle Ambiental

% realizado	% a realizar
50%	50%



PCAC (Estruturas do Barramento) / Condicionante 2.11 - ICMBio


% realizado	% a realizar
50%	50%

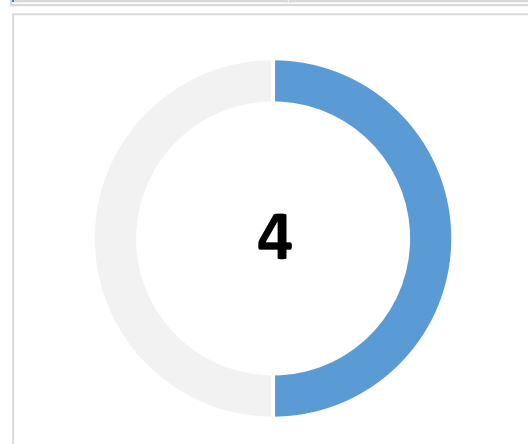

- Foram realizadas 02 inspeções ambientais no canteiro de obras;
- Aplicação de 02 listas de verificação ambiental no mês, com abordagem aos itens de meio ambiente, segurança e saúde ocupacional;
- Análise dos relatórios de SSTMA entregues pela CNO ao CEBI.

Programa de Recuperação de Áreas Degradadas


% realizado	% a realizar
25%	75%

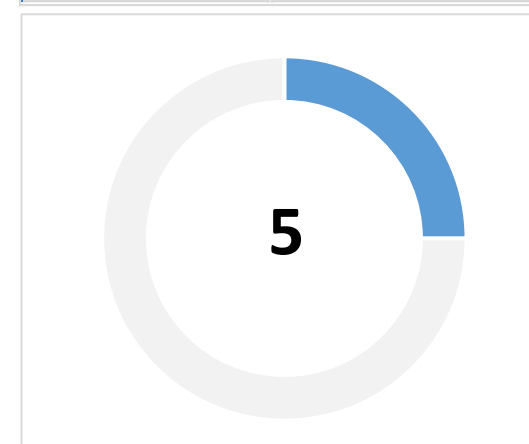

- Recuperação de áreas degradadas no canteiro de obras continuarão em caráter permanente à medida que novas áreas são liberadas;
- Análise de relatório mensal da CNO e verificação de conformidades e atendimento ambiental.


Prog. de Consolidação do Canteiro

% realizado	% a realizar
7%	7%

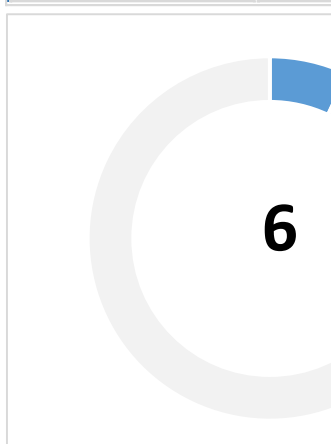

Programa de Acompanhamento de Direitos Minerários / Condicionante 10 - IAP


% realizado	% a realizar
50%	50%

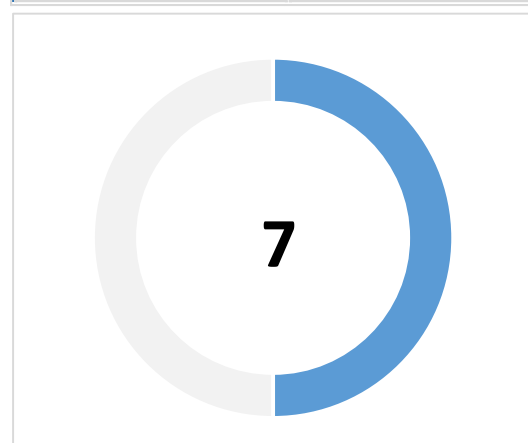

- Continuação do acompanhamento dos processos minerários na área do reservatório, pela empresa executora Prominer;
- Emissão dos relatórios mensais do andamento das tratativas no DNPM.

Prog. de Mon. do Lençol Freático e Qualidade das Águas Subterrâneas / Cond. 11 - IAP


% realizado	% a realizar
25%	75%

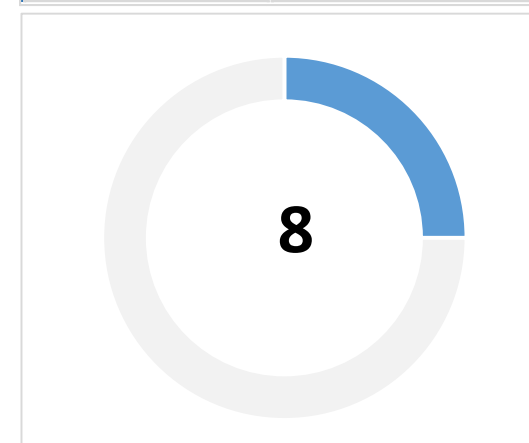

- Estão sendo monitorados 24 pontos pela empresa INEO, sendo que 01 ponto está localizado à jusante do barramento e os outros estão localizados à montante, que permitirão identificar alterações na dinâmica do aquífero na região;
- 03 pontos foram escolhidos para avaliar a qualidade da água em função do uso do solo e níveis de lençol freático;
- Protocolo do relatório de implantação dos poços de monitoramento.


Programa de Monitoramento

% realizado	% a realizar
25%	25%



Prog. de Limpeza da Bacia de Acumulação - DDD / Cond. 26 - IAP


% realizado	% a realizar
25%	75%

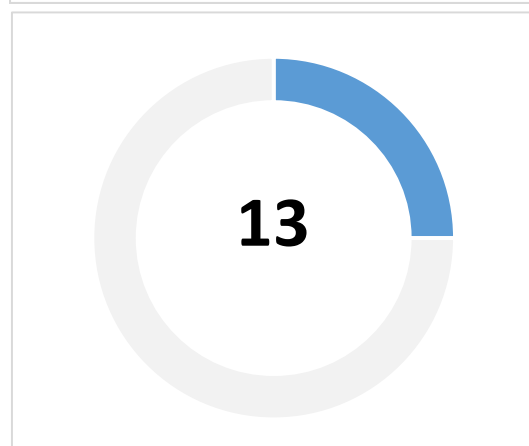

- Continuidade das atividades e processos quanto as mudanças e demolições para a liberação do reservatório;
- Foram realizados procedimentos de 14 mudanças e 01 demolições para o período.

Programa de Fiscalização dos Recursos Naturais / Condicionantes 1.3 e 2.7 - ICMBio


% realizado	% a realizar
25%	75%

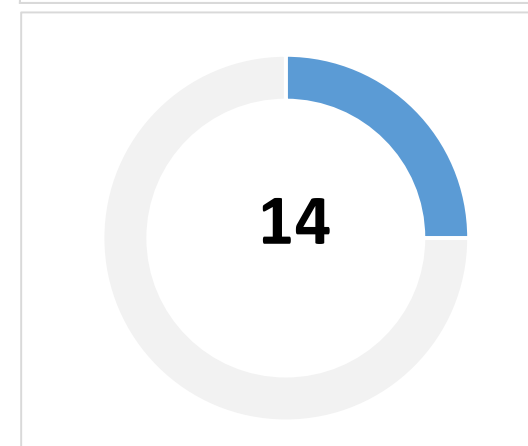

- Realização de atividades para definição do imóvel que será adquirido para a instalação da Casa de Apoio do Parque Nacional do Iguaçu em Capanema.


Programa de Resgate e Aproveitamento Cient. da Fauna / Cond. 28, 30, 31, 32, 33, 34 - IAP

% realizado	% a realizar
10%	90%



Programa de Estudos para Conservação da Flora / Condicionante 35 - IAP


% realizado	% a realizar
25%	75%

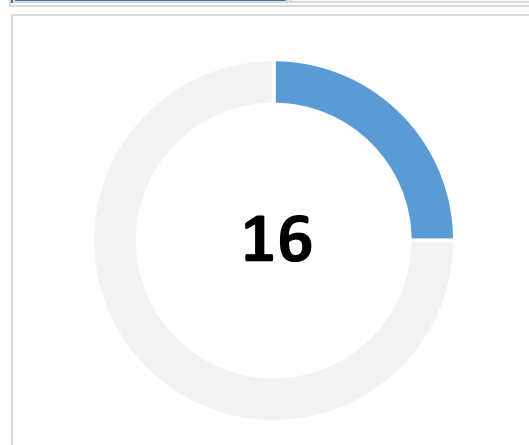

- Realizado procedimentos de contratação de empresa para a execução de Resgate de Fauna durante a etapa de Supressão Vegetal e Enchimento do futuro reservatório, incluindo as atividades do projeto de abelhas nativas;
- Início das obras para construção do cercamento do CETAS considerando a liberação do IAP apenas para esta atividade;
- Finalizada a contratação da empresa Ichthyology para o Resgate de Ictiofauna da Ensecadeira de 2ª fase (desvio do rio Iguaçu);
- Envio do Plano de trabalho para obtenção da Autorização Ambiental (resgate de ictiofauna).

Programa de Estudos para Conservação da Flora / Condicionante 35 - IAP


% realizado	% a realizar
7%	93%



- Contratação da empresa Juris Ambientis como empresa executora dos estudos que servirão de base para o atendimento do programa em tela.


Subprog. Limnologia e da Ictiofauna / Condi. 40, 41, 42, 43, 44 - IAP / 2.3 - ICMBio

% realizado	% a realizar
50%	50%



Subprog. de Monitoramento da Ictiofauna / Condi. 40, 41, 42, 43, 44 - IAP / 2.3 - ICMBio


% realizado	% a realizar
50%	50%

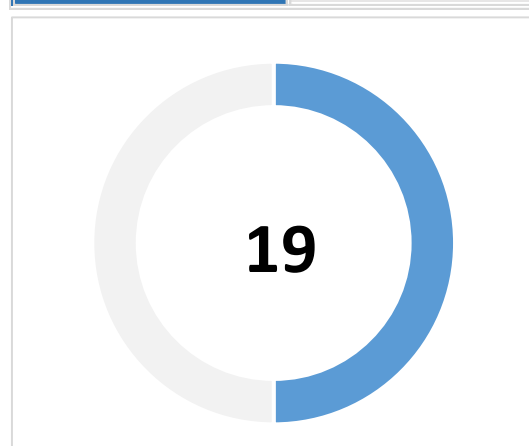

- Realização das campanhas de marcação do Surubim do Iguaçu, pela empresa NEOTROPICAL, sendo capturados 03 indivíduos, durante o período, na futura área do reservatório;
- Continuação das campanhas de monitoramento da Ictiofauna, pela empresa executora INEO, em atendimento ao cronograma.

Prog. de Mon. e Cons. da Fauna Terres. e Semi-Aquática / Cond. 45, 46 - IAP / 2.1 - ICMBio


% realizado	% a realizar
50%	50%

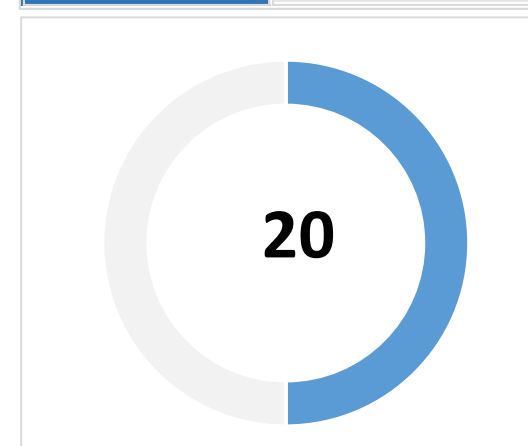

- Continuidade do monitoramento de fauna nas propriedades do entorno do PNI, para a fase 2 do Programa de Monitoramento e Conservação da Fauna;
- Elaboração de relatório das atividades do período, com o monitoramento da fauna terrestre, semiaquática e fauna atropelada;
- Aguardando a anuência ICMBIO/Dibio para início do monitoramento no ponto 12 (rio Floriano) e rio Iguaçu à jusante do barramento, conforme plano de trabalho, devendo ser solicitada pelo IAP.

Programa de Monitoramento e Conservação da Fauna / Cond. 45, 46 - IAP / 2.1 - ICMBio

% realizado	% a realizar
25%	75%

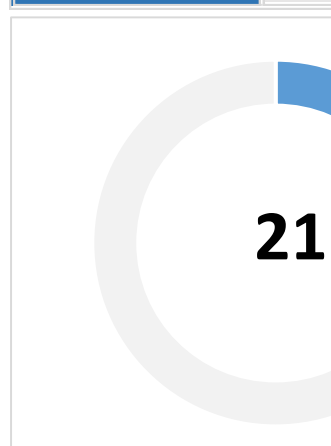

Programa de Saúde

% realizado	% a realizar
50%	50%

25

- Elaboração de Termo de Referência para solicitação de Proposta Técnica e Financeira para a execução dos treinamentos previstos no âmbito do Programa de Saúde para os profissionais de saúde dos Municípios;
- Continuidade do acompanhamento do setor de saúde do canteiro de obras através da análise dos relatórios emitidos pela CNO;
- Continuação da elaboração do Plano de Trabalho para obtenção da autorização ambiental para monitoramento de vetores;
- Aguarda-se a Autorização Ambiental para o monitoramento de vetores.

Programa de Seleção e Treinamento de Mão de Obra Local

% realizado	% a realizar
100%	0%

26

- Programa finalizado (ofício 044-2017 IAP-GDP).

Programa de Relocação da

% realizado	% a realizar
50%	

27

Programa de Desenvolvimento Turístico, Lazer e Recreação / Cond. 49 - IAP

% realizado	% a realizar
50%	50%

28

- Realização do protocolo do Plano de Desenvolvimento Turístico, Lazer e Recreação (PDTLR) no IAP, em 12/12/2017 (Carta CEBI_327_2017);
- Planejamento para realização de treinamentos complementares para a cadeia produtiva.

Programa de Prospecção Arqueológica / Condicionantes 50, 51, 52 - IAP

% realizado	% a realizar
50%	50%

29

- Foi realizada a revisão do projeto de resgate arqueológico, bem como a apresentação e protocolo no IPHAN do projeto atualizado.

Prog. de Gestão Ambienta

% realizado	% a realizar
25%	

30

Programa Onça Pintada: Consolidando Ações de Monitoramento e Educação Ambiental

% realizado	% a realizar
25%	75%

31

- Realizada a continuação da revisão técnica do Plano de Trabalho da empresa executora Sete;
- Elaboração do relatório com os dados do período (questionários socioambientais realizados nas propriedades do entorno do PNI).

Programa de Gerenciamento Ambiental / Condicionantes 54 - IAP / 1.3 - ICMBio

% realizado	% a realizar
25%	75%

32

- Gestão e andamento dos programas, bem como o acompanhamento das solicitações de órgãos ambientais e atendimento à requisitos legais pertinentes;
- Realização do protocolo no IAP do relatório mensal referente a outubro/2017 do Programa de Gerenciamento Ambiental, em 20/12/2017 (Carta CEBI_335_2017);
- Elaboração do relatório mensal referente a novembro/2017 do Programa de Gerenciamento Ambiental.


Condicionantes 01 e 02 - IA

% realizado	% a realizar
100%	

33

Condicionante 1.1 - ICMBio


% realizado	% a realizar
50%	50%

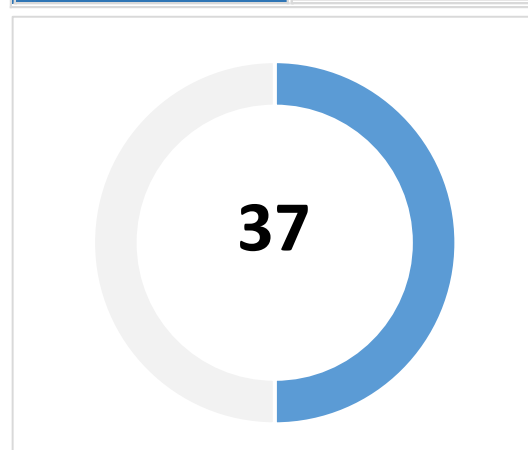

- Autorizações e licenças federais, estaduais, distritais e municipais, porventura exigíveis no processo de licenciamento estão em andamento, conforme a execução dos programas.

Condicionante 1.2 - ICMBio


% realizado	% a realizar
50%	50%

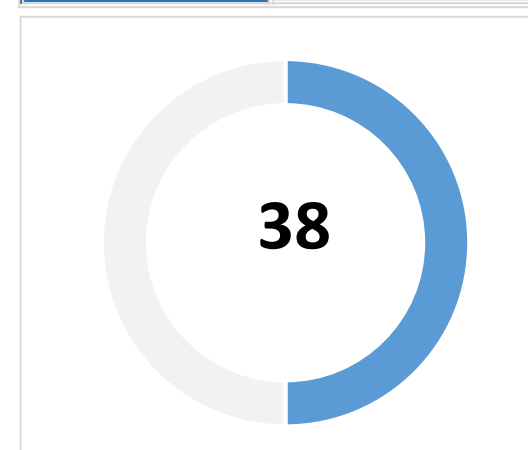

- O CEBI está ciente e vem atendendo as recomendações requeridas pelo ICMBio, visando à manutenção da ALA 001/2015 e suas recomendações e medidas de controle.


Condicionantes 60 - IAP / 1

% realizado	% a realizar
25%	



Condicionante 2.9 - ICMBio


% realizado	% a realizar
50%	50%

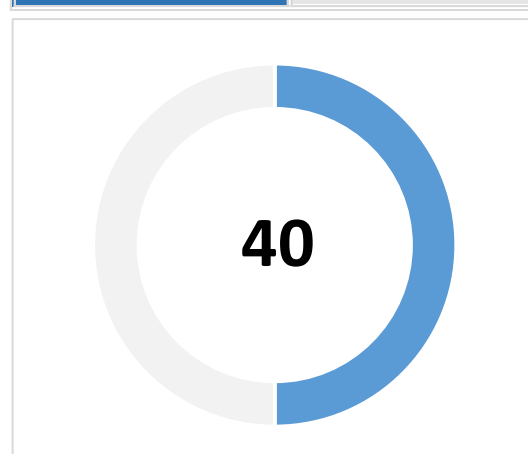

- O envio do Programa de Gerenciamento de Riscos foi apresentado no prazo solicitado da condicionante;
- Plano do período de instalação implementado em procedimentos da CNO (Protocolo IAP 13.574.952-4, Carta BI-DT-MA-42-2015).

Condicionante 2.12 - ICMBio


% realizado	% a realizar
100%	0%

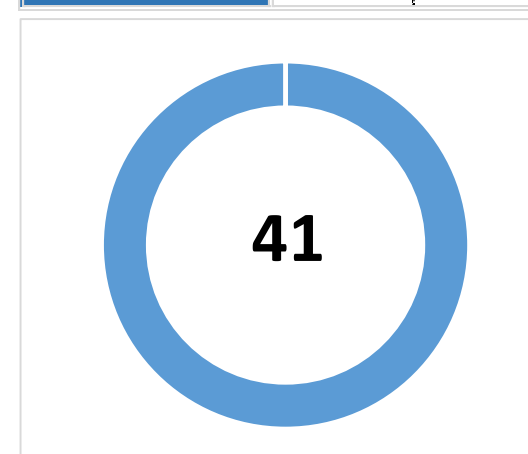

- Em atendimento pela Resolução ANA nº 142/2014 (artigo 6). O CEBI está ciente e deverá proceder conforme requerido.


Condicionante 37 - IAP

% realizado	% a realizar
0%	



Condicionante 56 - IAP


% realizado	% a realizar
50%	50%

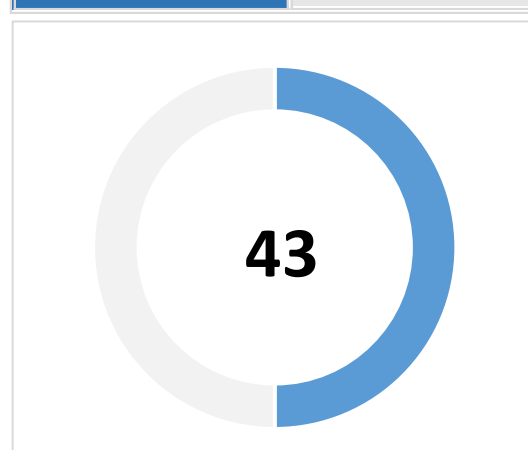

- Processo de regularização realizado separadamente do Licenciamento Ambiental da UHE Baixo Iguaçu.

Condicionante 62 - IAP / Cond. 2.10 - ICMBio


% realizado	% a realizar
75%	25%

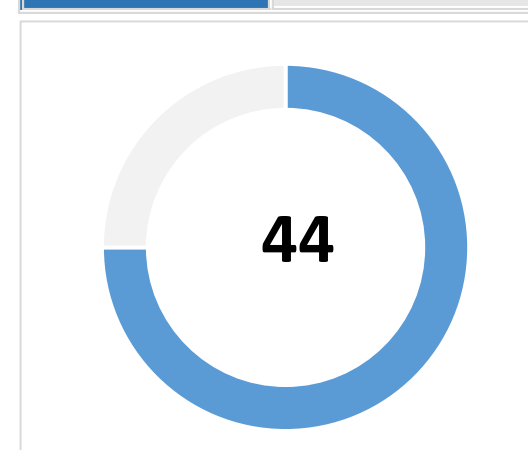

- O material foi removido e foi retirada a ensecadeira utilizada para essas atividades (relatório final protocolado como anexo ao Relatório Trimestral – abril a junho/2017);
- Carta CEBI-242-2017 IAP/PNI/ICMBio - Retirada do Material Depositado no Rio Iguaçu, no PNI (destruição da ensecadeira da obra em 2014);
- Aguardando manifestação do ICMBIO quanto a necessidade de retirada do material depositado na margem direita do rio Iguaçu.

Condicionante 2.8 - ICMBio

% realizado	% a realizar
100%	

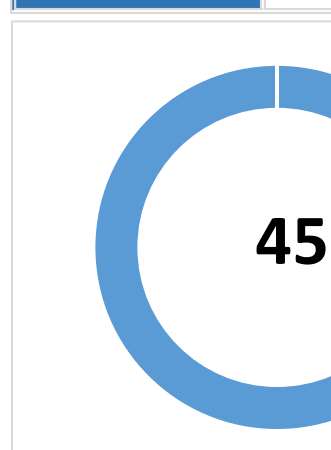

4. ATIVIDADES A REALIZAR NO PRÓXIMO PERÍODO

Os painéis a seguir apresentam as atividades a realizar no próximo período, de cada um dos pacotes de trabalho.

PACOTE 01 Programa de Comunicação Social / Condicionante 06 - IAP

- Previsto a continuidade do Programa Portas Abertas na obra, com a participação de diversas instituições da região;
- Previsto a continuidade da realização de comunicação institucional, com a divulgação de jingles em 4 emissoras de rádio, veiculação de anúncios em jornais e clippings informativos em veículos de comunicação;
- Continuidade do planejamento para as ações de comunicação durante o ano de 2018.

PACOTE 02 Programa de Educação Ambiental / Programa de Apoio à Elaboração das

- Previsto a elaboração de Relatório Consolidado Anual do PEA;
- Previsto a realização das Vivências em Educação Ambiental e as Oficinas junto as comunidades;
- Previsto a realização da Atividade junto aos Trabalhadores da obra;
- Previsto a elaboração de conteúdo para Folder e Cartilha para os Trabalhadores;
- Planejamento dos Fóruns de Educação Ambiental/ Constituição dos Coletivos do PEA e oficina de divulgação do edital, que constituirá os Núcleos de Educomunicação.

PACOTE 03 Programa de

- Previsto a realização
- Continuação da aplicação
- Continuação das análises

PACOTE 04 PCAC (Estruturas do Barramento) / Condicionante 2.11 - ICMBio

- Previsto a realização de 04 inspeções ambientais no canteiro de obras;
- Continuação da aplicação da lista de verificação ambiental, com abordagem aos itens de meio ambiente, segurança e saúde ocupacional;
- Continuação das análises dos relatórios de SSTMA entregues pela CNO ao CEBI.

PACOTE 05 Programa de Recuperação de Áreas Degradadas

- Continuação do acompanhamento de plantio no canteiro de obras;
- Recuperação de áreas degradadas no canteiro de obras continuarão em caráter permanente à medida que novas áreas são liberadas;
- Análise de relatório mensal da CNO e verificação de conformidades e atendimento ambiental.

PACOTE 06 Prog. de Co

- Prevista a efetivação
- Cercamento da APP, visando
- Resultados dos estudos
- Estudos para Conservação
- Vegetal a APP.

PACOTE 07 Programa de Acompanhamento de Direitos Minerários / Condicionante 10 - IAP

- Continuação do acompanhamento dos processos minerários na área do reservatório, pela empresa executora Prominer;
- Emissão dos relatórios mensais do andamento das tratativas;
- Após a renovação da RLI, será solicitada a prorrogação do pedido de bloqueio para área de canteiro de obras.

PACOTE 08 Prog. de Mon. do Lençol Freático e Qualidade das Águas Subterrâneas / Cond.

- Prevista a execução da 2ª campanha de monitoramento do nível do lençol freático para levantamento dos dados primários.
- Entrega de relatório com os resultados do período.

PACOTE 09 Programa de

- Previsto a continuidade
- Resolução;
- Prevista a entrega do
- empresa Alta Resolução

PACOTE 10 Prog. de Mon. Hidrossed. / Cond. 12, 19, 61- IAP / 2.5 (subitens) e 2.6 (subitens) -

- Previsto a continuidade do monitoramento hidrossedimentológico pelas empresas Envex e Construserv;
- Previsto o início das campanhas semanais e elaboração de Relatório de Atividades em

PACOTE 11 Programa de Monitoramento Climatológico / Condicionantes 20 e 58 - IAP

- Previsto a continuidade do monitoramento climatológico pela empresa SIMEPAR;
- Previsto a elaboração e entrega de Relatório Mensal de acompanhamento climatológico na região da UHE Baixo Iguacu.

PACOTE 12 Prog. de Lin

- Continuação do processo
- supressão da vegetação
- Aguarda-se a emissão

PACOTE 13 Prog. de Limpeza da Bacia de Acumulação - DDD / Cond. 26 - IAP

- Está previsto a continuidade das atividades relacionadas aos procedimentos de demolições e mudanças no âmbito no reservatório.

PACOTE 14 Programa de Fiscalização dos Recursos Naturais / Condicionantes 1.3 e 2.7 -

- Prevista reunião de renegociação quanto ao local que servirá de base de apoio, visto que, em vistoria ao local, os técnicos do ICMBio decidiram incluir uma casa funcional ao projeto e esta deverá ser construída.

PACOTE 15 Programa de

- Previsto o início das a

PACOTE 16 Programa de Resgate e Aproveitamento Cient. da Fauna / Cond. 28, 30, 31, 32, 33, 34

- Previsto a continuação do processo de contratação de empresa para a realização de atividades de Resgate de Fauna durante a Supressão Vegetal e durante o Enchimento do reservatório, incluindo o projeto de abelhas nativas;
- Previsto a obtenção da LI do CETAS;
- Início das atividades para as obras de construção do cercamento do CETAS, a ser realizada pela empresa Implanta contrata para execução do projeto.

PACOTE 17 Programa de Estudos para Conservação da Flora / Condicionante 35 - IAP

- Previsto o recebimento do Plano de Trabalho da empresa Juris Ambientis, bem como o início das atividades de campo.

PACOTE 18 Subprog. Li

- Continuação das cam
empresa INEO sendo e
zooplâncton, fitoplânct
aquáticas, além dos pa
- Para o mês de janeiro
- Prevista a emissão do

PACOTE 19 Subprog. de Monitoramento da Ictiofauna / Condi. 40, 41, 42, 43, 44 - IAP / 2.3 -

- Prevista a realização das campanhas de marcação do Surubim do Iguaçu, sendo que deverão ser capturados 17 indivíduos durante o período, fechando a meta de 50 indivíduos monitorados, na futura área do reservatório;
- Continuação das campanhas de monitoramento da Ictiofauna, pela empresa executora INEO, em atendimento ao cronograma;
- Previsto a entrega do Relatório Consolidado Anual do Monitoramento da Ictiofauna;
- Previsto o recebimento da dilação de prazo da Autorização Ambiental para a continuação do monitoramento.

PACOTE 20 Prog. de Mon. e Cons. da Fauna Terres. e Semi-Aquática / Cond. 45, 46 - IAP /

- Previsto a entrega do Relatório da 1ª Campanha do Programa de Monitoramento da Fauna, contemplando a Fase 2 do Programa, bem como dos dados brutos elencados;
- Preparação para a realização da 2ª Campanha de monitoramento fase 2, a ser realizada em fevereiro
- Aguardando a anuência ICMBIO/Dibio para início do monitoramento de fauna no ponto 12 (rio Floriano) e rio Iguaçu à jusante do barramento, conforme delineamento apresentado no plano de trabalho, devendo ser realizada solicitação diretamente pelo IAP.
- Previsto protocolo do Relatório Trimestral da 1ª campanha de Monitoramento da Fauna - fase 2.

PACOTE 21 Programa de

- Previsto a continuida
obra pela CNO.

PACOTE 22 Programa de Consolidação de Unidade de Conservação / Condicionante 59 - IAP

- Previsto o protocolo no IAP de carta contendo a atualização do valor da obra para fins de cálculo para compensação do corredor de biodiversidade
- O CEBI se encontra no aguardo da devolutiva quanto à minuta de Termo de Compromisso da

PACOTE 23 Prog. de Remanejamento e Mon. da População Atingida / Condicionantes 38,

- Previsto a continuidade dos processos de pagamentos e registros das escrituras públicas de desapropriação em nome do CEBI;
- Está previsto o início dos procedimentos para o reassentamento rural coletivo.

PACOTE 24 Programa de

- Previsto a contrataçã
pavimentação da Com

PACOTE 25 Programa de Saúde

- Planejamento das próximas ações a serem realizadas para o Programa de Saúde;
- Continuação da elaboração do Plano de Trabalho para obtenção da autorização ambiental para monitoramento de vetores;
- Aguarda-se a Autorização Ambiental para o início das atividades de monitoramento de vetores.

PACOTE 26 Programa de Seleção e Treinamento de Mão de Obra Local

- Programa finalizado (ofício 044-2017 IAP-GDP).

PACOTE 27 Programa de

- Previsto a continuidade das obras;
- Previsto a continuidade de infraestrutura do sistema;
- Previsto o início das atividades de realização da relocação.

PACOTE 28 Programa de Desenvolvimento Turístico, Lazer e Recreação / Cond. 49 - IAP

- Previsto a contratação da empresa para a realização da segunda etapa do Programa de Desenvolvimento Turístico, Lazer e Recreação.

PACOTE 29 Programa de Prospecção Arqueológica / Condicionantes 50, 51, 52 - IAP

- Previsto a obtenção de nova Portaria IPHAN para autorização das atividades de resgate arqueológico nos sítios da ADA;
- Reinício das atividades de resgate na área do reservatório.

PACOTE 30 Prog. de Ge

- Previsto o planejamento participativa do PACOTE

PACOTE 31 Programa Onça Pintada: Consolidando Ações de Monitoramento e Educação

- Planejamento para as próximas etapas do programa, sendo as oficinas comunitárias e mapeamento;
- Previsto o protocolo do Plano de trabalho para atualização do Programa de Monitoramento da Onça-Pintada.

PACOTE 32 Programa de Gerenciamento Ambiental / Condicionantes 54 - IAP / 1.3 -

- Gestão e andamento dos programas, bem como o acompanhamento das solicitações de órgãos ambientais e atendimento à requisitos legais pertinentes;
- Previsto a consolidação e protocolo no IAP do relatório mensal referente a novembro/2017 do Programa de Gerenciamento Ambiental;
- Previsto a elaboração do Relatório Anual Consolidado de Acompanhamento da Execução dos Programas e Condicionantes Ambientais;
- Previsto a elaboração do relatório mensal referente a dezembro/2017 do Programa de Gerenciamento Ambiental.

PACOTE 33 Condiciona

- Atendido.

PACOTE 34 Condicionante 03 e 04 - IAP

- Em atendimento. Os Relatórios trimestrais de andamento do PBA conitnuarão a ser apresentados junto ao IAP.

PACOTE 35 Condicionante 05 - IAP

- As ARTs ou equivalentes junto aos diferentes Conselhos Regionais Profissionais continuarão a ser encaminhadas em anexo aos Planos de Trabalho e nos relatórios dos Programas e Subprogramas ambientais apresentados junto ao IAP.

PACOTE 36 Condiciona

- O acompanhamento dos relatórios trimestrais e

PACOTE 37 Condicionante 1.1 - ICMBio

- As autorizações e licenças federais, estaduais, distritais e municipais, porventura exigíveis no processo de licenciamento estarão inseridas, conforme a execução dos programas.

PACOTE 38 Condicionante 1.2 - ICMBio

- O CEBI continuará atendendo às condições e recomendações requeridas pelo ICMBio, visando à manutenção da ALA 001/2015 e suas recomendações e medidas de controle.

PACOTE 39 Condicionante 1.3 - ICMBio

- As licenças ambientais federais, estaduais, distritais e municipais, porventura exigíveis no processo de licenciamento estarão inseridas, conforme a execução dos programas.
- O CEBI está ciente de que a ALA 001/2015 e das consequências da sua implementação.

PACOTE 40 Condicionante 2.9 - ICMBio

- O envio do Programa de Gerenciamento de Riscos foi apresentado no prazo solicitado da condicionante;
- Plano do período de instalação implementado em procedimentos da CNO (Protocolo IAP 13.574.952-4, Carta BI-DT-MA-42-2015).

PACOTE 41 Condicionante 2.12 - ICMBio

- Em atendimento pela Resolução ANA nº 142/2014 (artigo 6). O CEBI está ciente e deverá proceder conforme requerido.

PACOTE 42 Condicionante 2.13 - ICMBio

- O CEBI solicitou alteração da LO (Licença de Operação) para adequar a condicionante da LO (Licença de Operação) à realidade do projeto.

PACOTE 43 Condicionante 56 - IAP

- Processo de regularização realizado separadamente do Licenciamento Ambiental da UHE Baixo Iguaçu.

PACOTE 44 Condicionante 62 - IAP / Cond. 2.10 - ICMBio

- Aguardando manifestação do ICMBIO quanto a necessidade de retirada do material depositado na margem direita do rio Iguaçu.

PACOTE 45 Condicionante 63 - IAP

- Atendido.

PACOTE 46 Condicionante 17 - IAP

- Continuidade dos estudos que estão em fase de levantamento de dados pela empresa INEO.

PACOTE 47 Condicionantes 55 e 63 - IAP

- Consórcio Empreendedor Baixo Iguaçu (CEBI) está ciente e será solicitada tempestivamente autorização para o enchimento do reservatório e testes de comissionamento conforme previsto na Resolução Conjunta SEMA/IAP nº 004/2012.
